

【件名】

中野駅新北口駅前広場等の整備状況について


【要旨】（目的・内容・対象・時期・今後の方向等）

新北口駅前広場及びペDESTリアンデッキ等の基盤施設については、独立行政法人都市再生機構、東日本旅客鉄道株式会社及び国町東地区市街地再開発組合への委託により、今年度から随時、工事に着手している。

今回、これらの基盤施設の整備状況について、以下のとおり報告する。

1. エントランスデッキに接続する仮設階段について

新北口駅前各事業の進捗状況を踏まえ、橋上駅舎やペデストリアンデッキ等の供用開始後の中野五丁目方面や仮設バス停へのアクセス性、駅周辺の回遊性の向上を目的として、中野駅西側南北通路・ペデストリアンデッキレベルと新北口交通広場・東西連絡路レベルを繋ぐ仮設階段の整備をする。

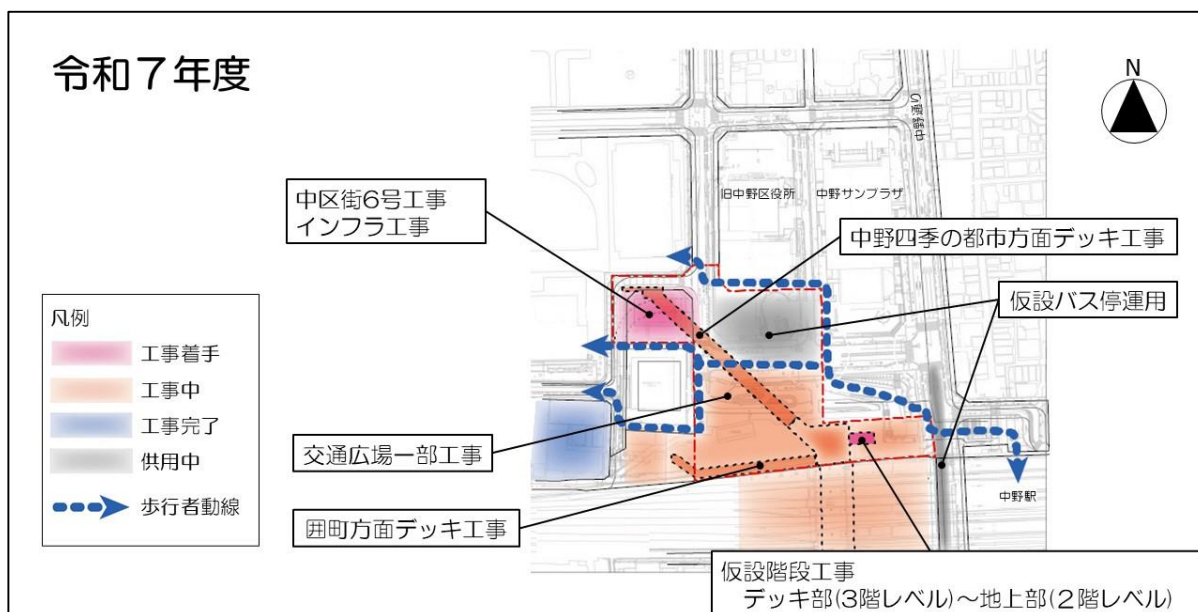

2. 自動二輪駐車場の確保について

NTTドコモ中野ビル南側の自動二輪駐車場は、ペDESTリアンデッキ等の工事に必要な施工ヤードの確保のため、令和6年9月末に閉鎖した。

当該自動二輪駐車場の閉鎖への対応として、今年度中に中野区役所地下駐車場内に11台分増設する。

今後も引き続き、工事期間中の駅周辺の自動二輪駐車場確保に向け、関係機関と連携、協議を図りながら対策を継続して行く。

3. 今後の予定

令和7年度	旧区役所低層棟・旧中野税務署解体完了 仮設バス停整備工事着手・運用開始 旧中野税務署跡地インフラ移設工事着手
令和8年度	中野駅西口改札開業 ペDESTロリアンデッキ工事完了（一部を除く）・供用開始
令和11年度	中野駅新北口交通広場供用開始
