

# 名勝哲学堂公園再整備事業の協議・検討状況について

## 名勝哲学堂公園整備検討委員会の設置

### ● 設置の目的

- ・文化財等に関する専門的知見を踏まえ、国名勝としての歴史的、文化的価値を考慮した再整備を行うため、同委員会を設置する。
- ・再整備期間中は、同委員会の継続的な指導・助言を受けながら、調査、設計、工事等を実施する。

### ● 構成員名簿

《学識者委員》

| 区 分    | 氏名（敬称略） | 所属・役職等            |
|--------|---------|-------------------|
| 委員（会長） | 亀山 章    | 東京農工大学 名誉教授       |
| 委 員    | 内田 青蔵   | 神奈川大学 特任教授        |
| 委 員    | 栗野 隆    | 東京農業大学 教授         |
| 委 員    | 北田 建二   | 東洋大学井上円了記念博物館 学芸員 |


《区職員》

区民部文化振興・多文化共生推進課長、健康福祉部スポーツ振興課長、公園課長

《オブザーバー》

文化庁、東京都教育庁、哲学堂公園指定管理者

## 令和6年度の検討経緯

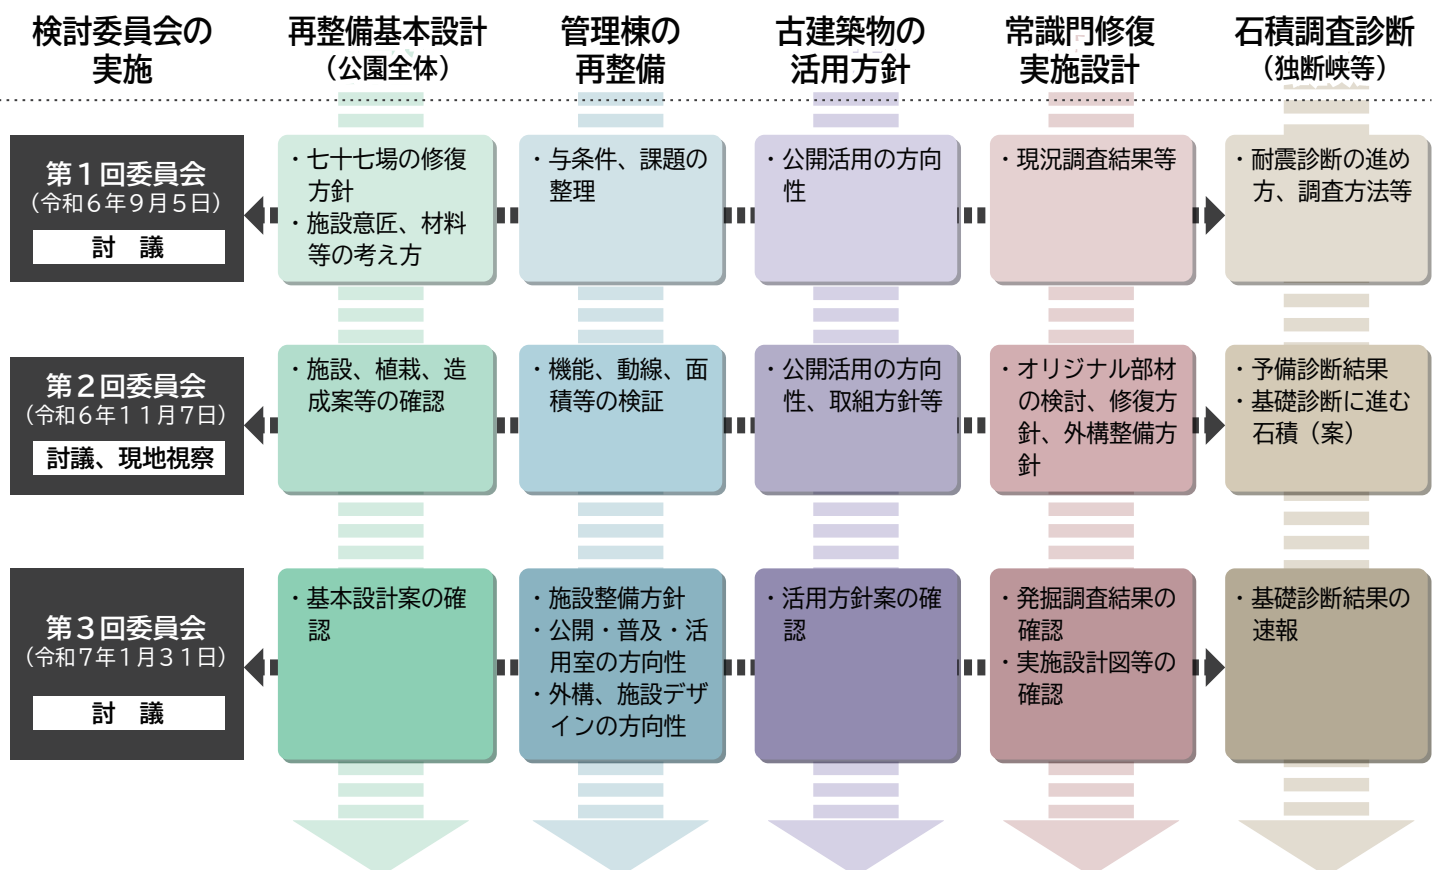

## 第1回検討委員会における主なご意見

- 日 時 令和6年9月5日（木）13時30分～16時30分
- 会 場 中野区役所 7階会議室
- 出席者 亀山委員、内田委員、北田委員

### 《再整備基本設計（公園全体）》

- ・「時空岡」の庭園としての景観は、古写真の状態に戻すのではなく、それを参考として、現状をどうしていくべきか判断する必要がある。建物が主題となっているように思える。
- ・「四聖堂」周囲の四ツ目垣は、後の年代になって付加されたものであり、無いほうが良い。
- ・「意識駅」とその他のベンチも含めて、考え方を整理する必要がある。
- ・「三学亭」の丸太階段は、その種類も含めて検討した方が良い。
- ・「三字壇」はオリジナルのものが残っている可能性もあり、当初の姿を資料で確認されたい。
- ・土系舗装の色彩は、なるべく現状や当初に近いものが良い。

### 《管理棟の再整備》

- ・鑽仰軒が隣接するため、発掘調査を着実に行って欲しい。

### 《常識門修復実施設計》

- ・複数にわたり改修が行われているので、資料調査を行い工事履歴を整理すべき。
- ・保管されている聯がオリジナルかどうかの確認が必要。
- ・西側控柱と礎石とのずれについて検証が必要。
- ・本柱の根巻きコンクリートの変遷について確認が必要。
- ・東側の建仁寺垣の振れが、昭和63年の図面から変わっている点について確認、整理が必要。
- ・不可解な点が多いので、試掘調査を実施すべき。

### 《石積調査診断》

- ・文化庁の石垣耐震診断指針（案）を基に調査を行うとのことだが、裏込めコンクリートを有する擁壁ということは無いのか。内部構造を確認のうえ、適切な方法を検討されたい。

## 第2回検討委員会における主なご意見

- 日 時 令和6年11月7日（木）13時～17時
- 会 場 哲学堂公園弓道場会議室、園内各所
- 出席者 亀山委員、内田委員、栗野委員、北田委員

### 《再整備基本設計（公園全体）》

- ・七十七場解説板については、文章の中身や詳細な図面も検討すべき。
- ・ベンチの配置は、利用実態等も踏まえて丁寧に検証する必要がある。
- ・地形や地割を保存する観点が欲しい。
- ・「相對溪」脇のトウネズミモチは、伐根ではなく伐採とし、法肩側に低木を列植すると良い。
- ・「天狗松」は、当時の場所への移植ではなく、現況のアカマツを天狗松と見立て、解説を施すことで良い。
- ・斜面地の転落防止柵は、高さ1.1mでは圧迫感があり過ぎるので、景観にも配慮すること。
- ・七十七場解説板のサイズや数量を見直し、QRコードとの併用を検討した方が良い。

### 《古建築物の活用方針》

- ・現状整理において、各建物の意味や用途と、現在の使われ方を「本来用途」としてまとめて記述している点が分かりづらい。
- ・建物の改変をある程度許容し、設備を充実して利活用を図るのか、保存を優先し可能な範囲での活用を図るのかの議論が必要。
- ・修復時に出る部材の保管や展示としての再利用方法等についても検討が必要。

#### 《管理棟の再整備》

- ・運動施設利用者と公開・普及・活用室の利用者は、用途や目的がかなり異なるので、動線を分けるべき。
- ・公開・普及・活用室というガイダンスの場が、哲学堂七十七場に入っていくにあたりどのような効果を持つのかの整理が必要。
- ・公開・普及・活用室と古建築物について、役割分担の整理が必要。

#### 《常識門修復実施設計》

- ・建具はかなり傷んでいるので、手間とコストを掛けて再利用するよりは、既存のものをもとに新設した方がよい。
- ・木材保護のためのガラス塗料は、可逆性が失われること、実績が不十分であることから使用せず、一般的な木材保護塗料を使用する方がよい。

#### 《石積調査診断》

- ・骨材に自然の玉石が入っているか、砕石やコンクリート片が入っているのかの違いが分かれば、おおよその年代について判断が可能。

## 第3回検討委員会における主なご意見

- 日 時 令和7年1月31日（金）13時～17時      ● 会 場 中野区役所 8階会議室  
● 出席者 亀山委員、栗野委員、北田委員

#### 《再整備基本設計（公園全体）》

- ・文化財は掘削だけではなく盛土にも限度があるが、さくらの広場の盛土については規模的にはあり得る。
- ・転落防止柵等の設置の際に掘削が生じる点については、事前に試掘調査のうえ、施工時にも立会確認を行うこと。出来れば現在の基礎位置に合わせる方がよい。
- ・転落防止柵は名勝として景観に配慮する必要もあるが、現在公園として供用されているので、安全面も十分考慮すべきである。
- ・テニスコート前にも観戦用のベンチを置いた方がよい。
- ・防犯カメラは児童遊園にも置いた方がよい。

#### 《古建築物の活用方針》

- ・髑髏庵へ髑髏の模型等を展示することについては、機微に触れるようなものなので、慎重に検討した方がよい。
- ・無尽蔵の展示について、建物の良さを活かす方向性か、現代的なギャラリーのような方向性なのか、設計等の際によく検討すべき。2階にあったとされる井上円了の書斎は、古写真等を活用した復元もあり得る。

#### 《管理棟の再整備》

- ・公開・普及・活用室を1階とするのが良いか、事務所を1階とするのが良いか、設計において利用・機能面をよく考慮して検討すべき。
- ・公開・普及・活用室における展示空間と、講習や体験学習等を行う空間とをフレキシブルに使うような方向性も考えられる。

#### 《常識門修復実施設計》

- ・礎石の下に基礎コンクリートを打つことや、アンカーボルトで柱脚を止めたりすることはせず、既存の構造で建てることを原則とし、必要最低限の対応として、礎控柱礎石のダボ加工のみ行う。
- ・煽り止め金物や控柱下の鉛板の新設、中段の肘壺金物の長さ変更については問題ない。

哲学堂再整備事業 想定スケジュール (再整備基本計画より)

※関係機関等との協議・検討状況により、今後変更となる場合があります。

設計 試験調査 工事等

| 項目・内容       |                                                                  | 短期 (R5~)                                                                                                                                                     |                         |    | 中期 (R10~) |     |     |     |     | 長期  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |                                                                  | R6                                                                                                                                                           | R7                      | R8 | R9        | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園整備事業      | 測量調査                                                             |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 公園再整備<br>舗装・給排水・案内板等<br>施設・バリアフリー化等の整備<br>植栽管理作業 (工事発注分)         | 基本設計<br>実施設計<br>1期工事<br>試験調査<br>整備工事<br>1期<br>実施設計<br>2期工事<br>試験調査<br>整備工事<br>2期<br>実施設計<br>3期工事<br>試験調査<br>整備工事<br>3期<br>実施設計<br>4期工事<br>試験調査<br>整備工事<br>4期 |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 児童遊園遊具改修<br>公園施設長寿命化計画に基づく更新                                     |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 植栽管理<br>指定管理者で実施困難な作業等を推進                                        |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 緊急対策工事<br>児童遊園藤棚・水施設 (ポンプ等)・梅園木橋                                 |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理棟         | 新築とした際の手順<br>仮設工事等<br>既存構解体撤去<br>埋蔵文化財調査<br>建築工事<br>備品工事<br>共用準備 | 検討・設計等                                                                                                                                                       |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 展示                                                               |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | ※管理棟の一部に文化財の公開活用のための整備を含む                                        |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 常設門                                                              | 実施設計<br>修復工事                                                                                                                                                 |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古建築物等修復     | 六賢台                                                              |                                                                                                                                                              | 調査・基本設計<br>実施設計<br>修復工事 |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 鬼神窟、接神室・霊明閣                                                      |                                                                                                                                                              | 調査・基本設計<br>実施設計<br>修復工事 |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 客観廬、主観亭                                                          |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 宇宙館、三学亭、無尽蔵                                                      |                                                                                                                                                              |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化財に関わる整備事業 | 石積調査<br>「文化財石垣 耐震診断指針(案)」を参考に実施                                  | 予備・基礎診断⇒(専門診断又は修理等)                                                                                                                                          |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 石造物等文化財施設<br>狸燈・鬼燈・天狗松その他七十七場<br>サイン・石標<br>公園再整備設計内で検討のうえ        | 基本設計<br>実施設計<br>1期工事<br>試験調査<br>整備工事<br>1期<br>実施設計<br>2期工事<br>試験調査<br>整備工事<br>2期<br>実施設計<br>3期<br>試験調査<br>整備工事<br>3期<br>実施設計<br>4期工事<br>試験調査<br>整備工事<br>4期   |                         |    |           |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
